

秦巴公司路域环境整治提升 工作简报

第二期

四川秦巴高速公路有限责任公司

二〇二三年五月

为认真贯彻落实《四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）关于印发〈四川省运营高速公路路域环境整治提升实施方案〉的通知》（川交综执 2023 38 号）文件精神，结合秦巴高速实际情况，制定了专项实施方案，成立了工作督导小组，压实工作责任，细化工作措施，开展联合摸排，明确提升措施、责任人、完成时间，建立动态管理台账，稳步推进整改工作。

秦巴公司路域提升总任务 314 项，5 月计划完成任务 70 项，实际完成 70 项，本月完成率 100%，5 月巴南段完成率 22%，巴陕段完成率 89.3%，广巴段完成率 49.36%，总任务完成率 46.8%，现将相关工作具体完成情况汇报如下：

一、主要提升措施

（一）强化绿化保洁

自开展路域环境整治提升工作以来，秦巴公司持续加大对路侧杂草清理、涵洞清淤、水沟清理、桥梁泄水孔清理、中分带绿植补栽等问题的整改力度，为驾乘人员营造出一个“畅、安、舒、美、洁”的良好出行环境。


5 月重点完成了杂草、枯枝清理，泄水孔、边沟疏通等日常保洁工作，其中完成泄水孔清理 161 个，完成中分带绿植补栽 872 株，路侧遮挡物清理 20.5km，路侧杂草清理 23.2km，护栏板清洗 8.2km。

绿植杂草清理、保洁

巴南段 K288-K290 双向清理路侧杂草



巴南段 K275-K310 双向清理水沟杂草

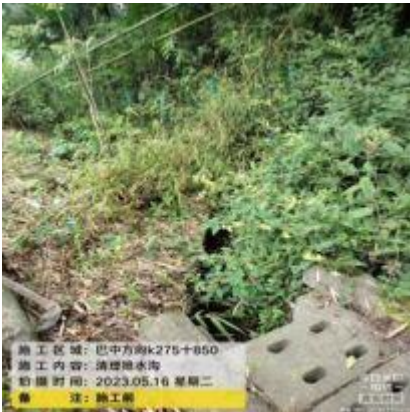

巴南段 K310-K320 处机械修剪绿植



巴陕段巴陕向 827 人工清洗新泽西护栏



巴陕段巴陕向 828 人工清洗新泽西护栏



巴陕段巴陕向 826 人工清洗新泽西护栏



巴南段 K275-K310 双向清理侵界绿植



巴陕段 K870 处清理侵界绿植



巴陕段 K883+500 处清理掉落绿植



巴陕段 K871 处清理侵界绿植



广巴段 K424+400-K481+109 K0-K19+456 路测清理掉落树枝



广巴段 K375 处清理路侧侵界绿植



陕段陕巴向 K850 处清理路侧侵界绿植



广巴段 K424+400-K481+109、K0-K19+456 路测、边沟清杂修枝



中分带苗木补栽

广巴段 K424+400-K481+109 K0-K19+456 中分带植株补栽



广巴段 K424+400-K481+109 K0-K19+456 中分带植株补栽



桥梁伸缩缝、泄水孔清理

广巴段 K424+400-K481+109 K0-K19+456 清理桥梁泄水孔



广巴段 K378+200 处清理桥梁泄水孔



广巴段 K378+200 处清理桥梁伸缩缝



广巴段 K424+400-K481+109 K0-K19+456 疏通桥梁泄水孔



广巴段广巴向 K372+200 疏通桥梁泄水孔



广巴段巴广向 K383+100 清理桥梁伸缩缝



(二) 注重日常管养

持续推进桥梁伸缩缝修复、路面坑槽修补、水沟修复、路面裂缝处治等日常养护工作，最大限度优化驾乘人员通行体验。


5月完成桥梁处置5处，其中桥梁伸缩缝焊接梳齿板2处，更换伸缩缝型钢3处，完成路面裂缝处置8处累计修复1328m。

桥梁伸缩缝更换型钢

巴陕段陕巴向 K828+610 双向主车道+应急车道更换伸缩缝型钢



巴陕段陕巴向 K813+860 双向主车道+应急车道更换伸缩缝型钢

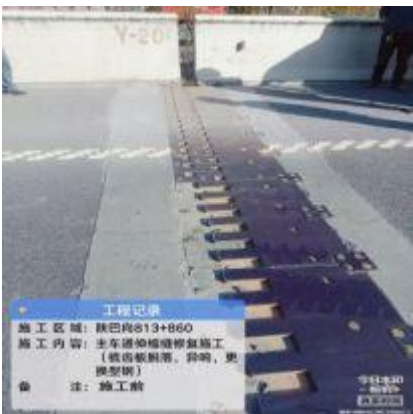

巴陕段巴陕向 826+420 更换桥梁伸缩缝型钢并浇筑砼



路面裂缝修复

广巴段 K447-452 处路面龟裂灌封



巴陕段 K866+015-865+930 处路面裂缝修复



(三) 加快交安设施修复

对辖区波形护栏板、轮廓标、边网、水沟盖板、警示膜等交安设施进行重点修复，加强日常巡查，做到“随查随修”，确保各类设施

安全运行、完善可靠。

5月完成交安处置28处，其中刺铁丝修复9m、边网99m，边沟安装盖板累计98块，弹力柱更换安装24支，护栏板螺丝安装12km。

安装、更换水沟盖板

巴南段磨盘山隧道内巴中方向更换边沟盖板



巴南段 K270+700 巴中方向新增水沟盖板



巴南段 K271+100 巴中方向向新增水沟盖板



巴南段 K242+900 巴中方向安装水沟盖板



巴南段 K247+500 巴中方向安装水沟盖板



巴南段 K251+700 巴中方向安装水沟盖板



新增护栏板、防眩板

巴南段 K275-K310 双向补充防眩板



护栏板螺栓螺帽缺失更换

广巴段 K341+409-K369+600、K369+000-K368+00 更换螺栓螺帽



广巴段 K367+400 处护栏板安装螺栓螺帽



广巴段广巴向 K364+200 护栏板螺栓螺帽缺失更换



广巴段广巴向 K362+500 护栏板螺栓螺帽缺失更换



(四) 服务设施提升

持续优化各服务区、收费站服务质量、环境卫生，对各类老化、破损设施进行了全面翻新、修复，通过加大保洁力度，提高垃圾清理频率等方式来提升辖区环境品质。

5月完成了5座隧道加宽带清扫、轮廓标擦洗、隧道壁清洗相关工作，1座收费站、1处服务区交安设施恢复工作。

巴南段何家坝收费广场地面开裂修复



巴南段何家坝收费站站房门口地面开裂处治



巴南段下八庙服务区成都方向雨污水井周围脱空处治



巴南段 K275-K310 鸡公梁隧道清理轮廓标



巴陕段八庙隧道垃圾清理



巴陕段蒋家坡隧道轮廓标清理



巴陕段八庙隧道电缆沟壁修复

