

秦巴公司路域环境整治提升 工作简报

第三期

四川秦巴高速公路有限责任公司

二〇二三年六月

为认真贯彻落实《四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）关于印发〈四川省运营高速公路路域环境提升实施方案〉的通知》（川交综执 2023 38 号）文件精神，结合秦巴高速实际情况，制定了专项实施方案，成立了工作督导小组，压实工作责任，细化工作措施，开展联合摸排，明确提升措施、责任人、完成时间，建立动态管理台账，稳步推进整改工作。

秦巴公司路域提升总任务 325 项，累计完成 216 项，总任务完成率 66.5%。6 月计划完成任务 88 项，实际完成 88 项，本月完成率 100%。巴南段任务 159 项，已完成 75 项，完成率 47%，巴陕段任务 87 项，已完成 85 项，完成率 97.7%，广巴段任务 79 项，已完成 56 项，完成率 70.8%。现将相关工作具体完成情况汇报如下：

一、主要提升措施

（一）强化绿化保洁

自开展路域环境整治提升工作以来，秦巴公司持续加大对路侧杂草清理、涵洞清淤、水沟清理、桥梁泄水孔清理、中分带绿植补栽等问题的整改力度，为驾乘人员营造出一个“畅、安、舒、美、洁”的良好出行环境。

6 月重点完成了杂草、枯枝清理，泄水孔、边沟疏通等日常保洁工作，其中完成中分带绿植补栽 21km、泄水孔清理 104 个，中分带绿植修

剪 119.6km，路侧杂草清理 10km，中分带护栏清洗 13.5km 边沟清理 7 公里。

绿植杂草清理、保洁

通王向 K67 处路肩除草



广巴段广陕向雪峰隧道入口处杂物清理



巴南段 K280-K285 遮挡标识标牌路侧绿植修剪



巴陕段 K310-K320 机械修剪中分带绿植



广巴段五房岩隧道边沟清理



广巴段 462+650 赵家沟大桥桥下空间清理



巴陕段 K310+300-K323+800 波形护栏清洗



中分带苗木补栽

广巴段巴广向 K347+100 补栽苗木



广巴段 K355+600 处中分带绿植补栽



广巴段 K368+500 处中分带苗木补栽



(二) 注重日常管养

持续推进桥梁伸缩缝修复、路面坑槽修补、水沟修复、路面裂缝处治等日常养护工作，最大限度优化驾乘人员通行体验。

6月完成桥梁伸缩缝处置13处，对5座桥梁增设防抛网，完成路面裂缝处治5处累计修复68m，2处路面拥包处治。

桥梁处治

广巴向 K402+100 处伸缩缝破损修复



广巴向 K401+350 处伸缩缝破损修复



广巴向 K400+700 处伸缩缝破损修复



巴南段东兴场互通广元至成都方向匝道桥面拥包处治



路面裂缝修复

巴南段 K275-K310 双向路面裂缝处治



巴南段恩阳主线转巴中西方向匝道车辙拥包处治



巴陕段 K310+300-K323+800、K854+500-K898+900 处路面坑洞修补



（三）加快交安设施修复

对辖区波形护栏板、轮廓标、边网、水沟盖板等交安设施进行重点修复，加强日常巡查，做到“随查随修”，确保各类设施安全运行、完善可靠。

6月完成交安处置46处，其中完成4处边网补设累计12m，4处防眩板更换累计41块，4处收费站匝道反光道钉安装，护栏板螺丝安装11km，28处边沟盖板更换累计136张，6处护栏板更换，1座收费站标线清理施画等。

安装、更换水沟盖板

巴南段巴南段 K217+500 成都方向新增、更换盖板



新增护栏板、防眩板

巴陕段 K840+872 更换防眩板



巴陕段 K850+347 更换防眩板



王通段通王向 K61+500 处更换护栏板



王通段通王向 K61+520 处更换护栏板



护栏板螺栓螺帽缺失更换

广巴向广巴向 K350+900 补设螺栓螺帽



广巴段广巴向 K354+000-K350+000 补设螺栓螺帽



巴陕段 K310+300-K323+800、K854+500-K898+900 护栏螺栓缺失增设



巴陕段巴中收费站匝道、K320-K324 应急车道更换附着式轮廓标



新增边网

巴南段巴中向 K283+700、K291+550 成都向 K304+200、K292+800 补充增设边网



王通向 K61+700 处更换边网



巴南段恩阳河大桥、太极图大桥、之字河一号桥、彭家坝大桥、双石大桥加装防抛网



(四) 服务设施提升

持续优化各服务区、收费站服务质量、环境卫生，对各类老化、破损设施进行了全面翻新、修复，通过加大保洁力度，提高垃圾清理频率等方式来提升辖区环境品质。

6月完成了，4座隧道脏污标线清理，8处脏污隧道壁清理、轮廓标擦洗、隧道壁清洗相关工作，6座收费站、2处服务区交安设施恢复工作。

巴陕段茅贯山隧道、鹰嘴山隧道、蒋家坡隧道、韩坡岭隧道、下两隧道群、八庙隧道、射洪寨隧道清洗隧道壁



清洗前



清洗中



清洗后

巴南段观音庵收费站匝道、恩阳收费站匝道、柳林收费站匝道、何家坝收费站匝道安装反光道钉




巴南段柳林收费站出站车道清理后重新施划并增设标线



正直收费站站房外墙瓷砖脱落处治（施工已全部完成）



巴南段下八庙服务区暖心之家门口地面漆破损剥落修复

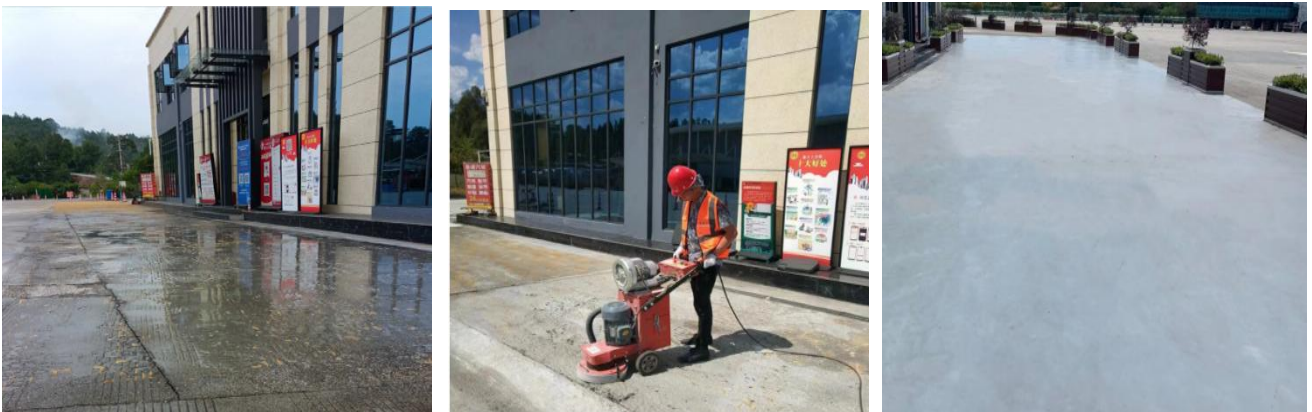

巴南段仪陇站、五福站墙面返碱修复

